

Relatório GT Mitigação e Desocupação


18 / 08 / 2023

EAF

CRIADA CONFORME
DETERMINAÇÃO
DA ANATEL

FSS - Mitigação

Data-base: 16/08/2023

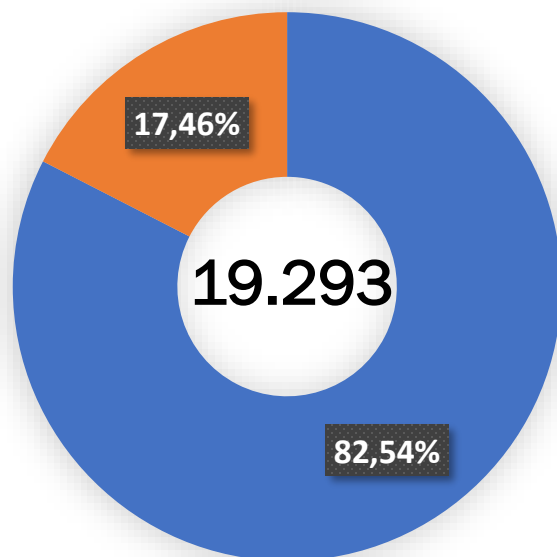

■ 15.925 INSTALAÇÕES CONCLUÍDAS
■ 3.368 INSTALAÇÕES A CONCLUIR

STATUS - EDITAL

FASE I (capitais)

27 Municípios

100%

FASE II (>500k)

26 Municípios

100%

FASE III (>200k)

102 Municípios

100%

FASE IV (>100k)

145 de 171 Municípios

88%

FASE VI (>30k)

526 de 848 Mun.

69%

CIDADES MENOS DE 30K


3095 de 4396 Municípios

76%

EA

FSS - Desocupação

Data-base: 16/08/2023

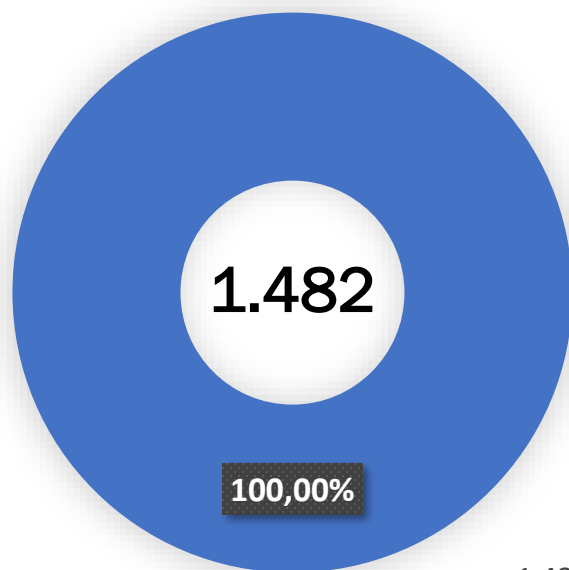

■ 1.482 CONCLUIDOS

STATUS - EDITAL

FASE I (capitais)

216 Estações

100% Concluído

FASE II (>500k)

46 Estações

100% concluído

FASE III (>200k)

195 Estações

100% concluído

FASE IV (>100k)

185 Estações

100% concluído

FASE V (>30k)

457 Estações

100% concluído

CIDADES MENOS DE 30K

383 Estações

100% concluído

EA
