

Relatório Mitigação e Desocupação

18/07/2025

EAF



CRIADA CONFORME
DETERMINAÇÃO
DA ANATEL

FSS – Mitigação



Mitigação Preventiva

Data-base: 18/07/2025

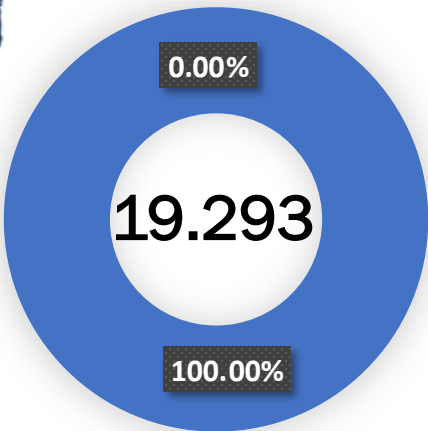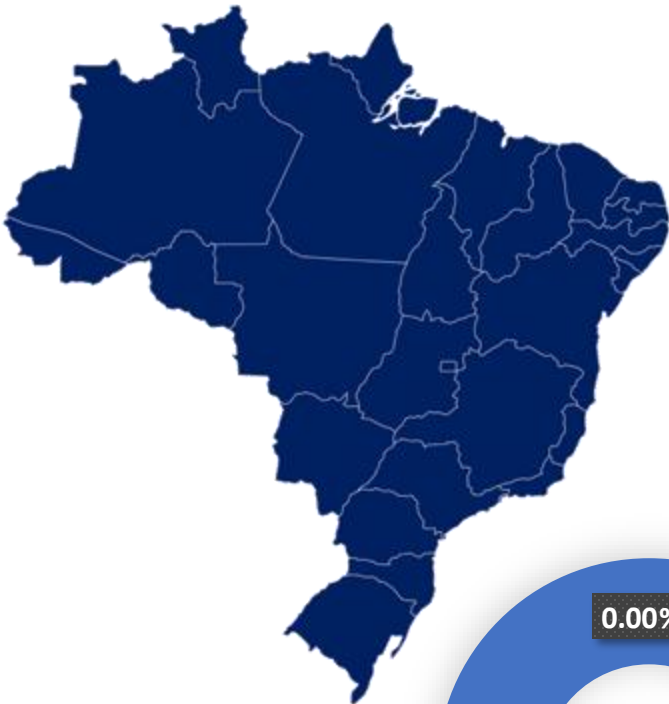

■ 19.293 CONCLUIDAS ■ 0 A CONCLUIR

STATUS – EDITAL

FASE I (capitais)

27 Municípios	100%
---------------	------

FASE II (>500k)

26 Municípios	100%
---------------	------

FASE III (>200k)

102 Municípios	100%
----------------	------

FASE IV (>100k)

171 Municípios	100%
----------------	------

FASE V (>30k)



848 Mun.	100%
----------	------

CIDADES MENOS DE 30K

4.396 Municípios	100%
------------------	------



FSS - Desocupação

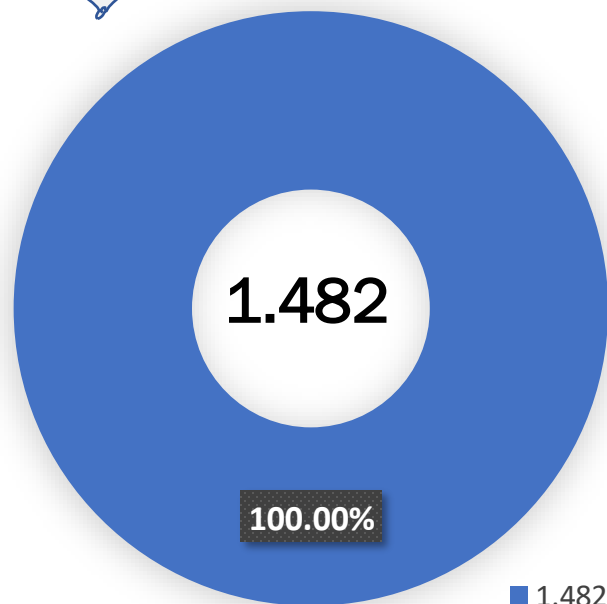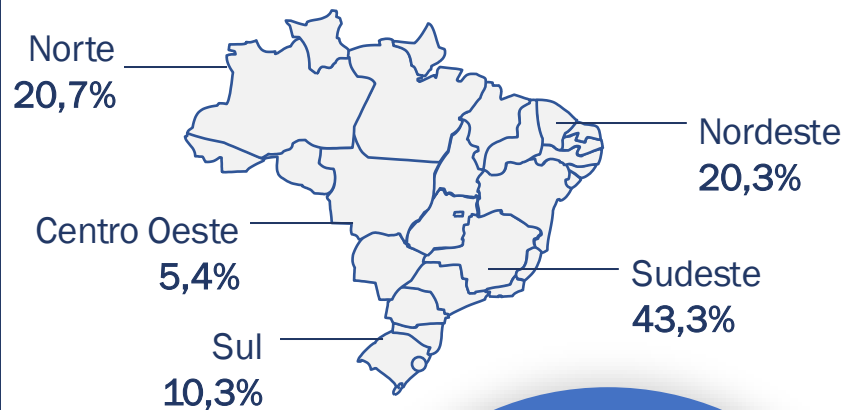

■ 1.482 CONCLUIDOS
■ 0 A CONCLUIR



STATUS - EDITAL

FASE I (capitais)

216 Estações

100% Concluído

FASE II (>500k)

46 Estações

100% concluído

FASE III (>200k)

195 Estações

100% concluído

FASE IV (>100k)

185 Estações

100% concluído

FASE V (>30k)

457 Estações

100% concluído

CIDADES MENOS DE 30K

383 Estações

100% concluído

- 100% concluído em Julho/2023
- Atualização do cadastro Anatel em andamento

EAF
